


SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
FONDO METROPOLITANO
TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2021
REPORTE CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	FOLIO SEFIR	PROYECTO	MONTO AUTORIZADO Y TRANSFERIDO FEDERAL	MONTO AUTORIZADO ESTATAL	MONTO TOTAL AUTORIZADO Y TRANSFERIDO FEDEDERAL + ESTATAL	CONTRATADO	INDIRECTOS SOBRE MONTO AUTORIZADO Y TRANSFERIDO FEDERAL	MONTO COMPROMETIDO FEDERAL	MONTO COMPROMETIDO ESTATAL	MONTO NO COMPROMETIDO ESTATAL	DATOS DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA			METAS PROGRAMADAS		EJECUTOR	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
													MUNICIPIO	LOCALIDAD	COORDENADAS	META	UNIDAD			
1	12660545	CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL EN CRUCERO DE AVENIDA MORELOS NORTE CON EL PERIFERICO REVOLUCION-REPÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$ 445,299,292.21	\$ 50,000,000.00	\$ 495,299,292.21	\$ 487,529,656.47	\$ 7,570,087.97	\$ 445,299,292.21	\$ 49,800,452.23	\$ 199,547.77	DCC/LPF/200349-E10/2020 CORTEZ PALMA CIA. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	24 DE DICIEMBRE DE 2020	MORELIA	MORELIA	19°43'16.59"N 101°11'17.57"O	3,747	M2 GASA VIAL PASO SUPERIOR VEHICULAR DE CONCRETO HIDRÁULICA LOSA (CLARO)	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	45%	71%
																6,357	M2 GASA VIAL PAVIMENTACIÓN DE CARRILES CON CONCRETO ASFALTICO EN PSV			
																1,413	ML GASA VIAL CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN PSV			
																1,413	ML GASA VIAL COLOCACIÓN DE PARAPETOS PARA PASO ELEVADO			
																6,685	M2 PIV CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR MUROS A BASE DE PILOTES			
																13,700	M2 PIV PAVIMENTACIÓN DE CARRILES CON CONCRETO ASFALTICO			
																955	M2 CONSTRUCCIÓN DE CAMELLÓN CENTRAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 1M DE ANCHO			
																3,820	ML CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES (LATERALES Y EN CAMELLÓN)			
																1,910	ML PIV COLOCACIÓN DE PARAPETOS EN CABEZA DE MURCS DE CONCRETO			
																355	M2 PIV CONSTRUCCIÓN DE CLARO DE LOSA DE CONCRETO KM 40+102.20 EN CRUCE EN TRENZA			
																1,290	M2 PIV CONSTRUCCIÓN DE CLARO DE LOSA DE CONCRETO EN CRUCERO (KM 40+244)			
																210	M2 PIV PAVIMENTO ASFALTICO PARA RETORNOS SOBRE CLARO EN CRUCE (KM 40+244)			
																355	M2 PIV CONSTRUCCIÓN DE CLARO DE LOSA DE CONCRETO EN KM 43+609.27 EN CRUCE DE TRENZA			
																7,849	ML COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PSV Y PIV			
521	PZA COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PSV Y PIV																			
2,212	PZA COLOCACIÓN DE VIELETAS REFLECTORAS PSV Y PIV																			

** La información aquí reportada esta en función a lo que marcan las Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo Metropolitano de fecha 31 de Enero 2020, indicado en el Numeral 47 citando lo siguiente: "Las Entidades federativas que conforman cada Zona Metropolitana deberán publicar trimestralmente, en su página de Internet y en otros medios accesibles al ciudadano, la información actualizada respecto de la autorización de recursos, así como la relativa a la descripción de las obras, montos, metas, proveedores, y avances físicos y financieros, así como las demás obligaciones que derivan del cumplimiento de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública"

COORDENADAS: <https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B043'16.7%22N+101%C2%B011'17.8%22W>
<https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B043'16.0%22N+101%C2%B011'18.0%22W>
<https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B043'17.0%22N+101%C2%B011'17.2%22W>
<https://www.google.com.mx/maps/place/19%C2%B043'16.7%22N+101%C2%B011'17.6%22W>
 INFORME: <https://scop.michoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Tercer-Informe-Fonmetro-Distribuidor-Vial-Salamanca-2021.pdf>
 CONTRATO: <https://scop.michoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2018/08/SEGUNDO-INFORME-FONMETRO-DIST-VIAL-SALAMANCA.pdf>

LINKS:

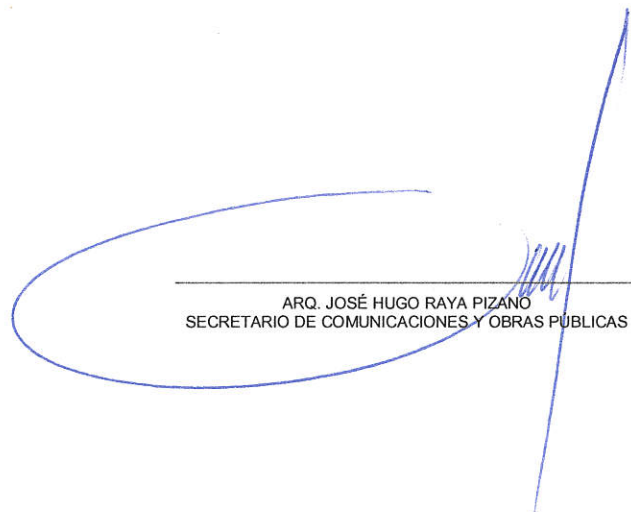


ARQ. JOSÉ HUGO RAYA PIZANO
SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS



M. EN I. HERIBERTO ENRIQUE CIRA GUERRA
SECRETARIO TECNICO



ARQ. MARÍA ROSAURA FLORES SÁNCHEZ
DELEGADA ADMINISTRATIVA



ING. JAIME GARCÍA LEMUS
DIRECTOR DE CAMINOS Y CARRETERAS



ING. ADALBERTO GONZÁLEZ NAVARRETE
SUBDIRECTOR DE CAMINOS Y CARRETERAS
